- **SEGUNDO TRIMESTRE 2013**
  ABRIL A JULIO DE 2013

A principios de abril se llevó a cabo un curso de capacitación en de desinfección de agua y enfermedades relacionadas con el agua impartida por la Secretaría de Salud hacia el personal del SCAPSZ.

Durante varias semanas se apoyó en los trabajos de desazolve con el camión Vactor en diversas colonias del municipio. En este caso los días del 27 de abril al 3 de mayo se realizaron las actividades de apoyo en las avenidas principales del Centro de Zacatepec y en la Colonia Alianza.

Calle Lorenzo Vázquez, colonia Miguel Alemán, Zacatepec (a la altura del DIF Municipal)

El 1 de mayo una falla eléctrica provocó un severo daño al equipo de bombeo Tulipanes – Mirador; quemándose el contactor y transformador del arrancador y el motor de la bomba. El 3 de mayo se reparó el arrancador, instalándose una bomba de emergencia de 75 hp propiedad del SCAPSZ el 4 de mayo regularizándose así el servicio.

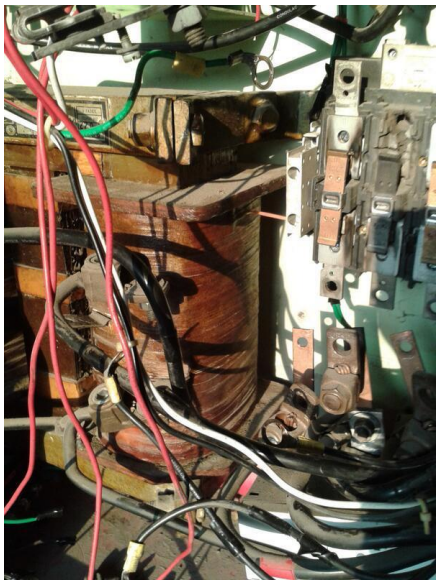

Daño al contactor del arrancador

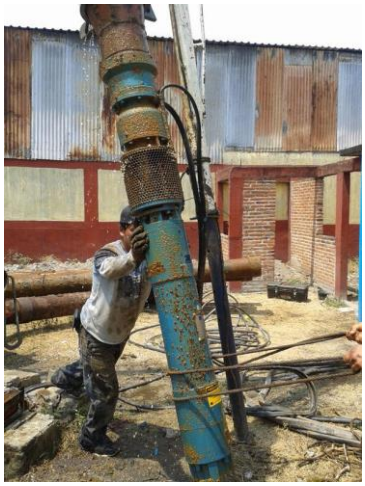

La bomba dañada es retirada

Instalación de bomba de emergencia

Se repara el arrancador de la bomba

Prueba de bomba emergencia

Durante el mes de mayo se llevaron a cabo las labores de prevención de inundaciones apoyando actividades del camión Vactor en distintas colonias del municipio, el desazolve de la calle Guillermo Prieto de la colonia Benito Juárez, calle Ignacio Maya de la colonia Miguel Alemán y en la colonia Gran Alianza a través de la dirección de Obras Públicas y en coordinación con el Sistema de Conservación Agua Potable Y Saneamiento de Zacatepec.

13 de mayo.- Reunión de la 25 Sesión Ordinaria del Consejo de Cuenca del Río Apatlaco en Taltizapán, en representación del Ing. Abdón Toledo Hernández.

En la primera semana del mes de junio se llevó a cabo el acto de Entrega – Recepción de las instalaciones de la casa de la cultura a los coordinadores de “La Cultura del Agua” del SCAPSZ. (ver informe semestral Cultura del Agua).

El día 19 de junio llevó a cabo la tercera Junta de Gobierno para la aprobación de la propuesta del aumento gradual de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) gradualmente a la tarifa tanto de drenaje como para la cuota del servicio de agua potable. Dada la aprobación de la junta de gobierno se convocó a todos los ayudantes de las colonias dentro del padrón de usuarios del sistema con la finalidad de dar a conocer las estrategias de recuperación económica y operativa del Sistema e informar del incremento en la cuota de agua y drenaje, que es una de las medidas principales para dicha recuperación.

20 de junio.- Reunión en para logística del festival de cine bajo la coordinación del programa Cultura del Agua.

A partir del día viernes 21 de junio, re-inician los trabajos de rehabilitación en la red de drenaje de la cabecera municipal de Zacatepec y así como también se detectan los puntos críticos con la finalidad de prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias, dando mantenimiento preventivo a la red de drenaje municipal.

Zacatepec, Centro

Zacatepec, Centro

Zacatepec, Centro

Zacatepec, Centro

Julio 3.- Falla en la bomba Galeana Centro

Motor dañado de la bomba de Galeana, Centro. Instalación de bomba reparada.

Julio 4.- Reunión de coordinación en el Tecnológico de Zacatepec para dar a conocer la Normatividad Ambiental y ámbitos de competencia, así como los programas y/o proyectos el Sector Ambiental Federal y Estatal en el cual estuvieron presentes personalidades de SEMARNAT, CONAGUA, CONAFOR, PROFEPA. Por el Municipio de Zacatepec asistieron ayudantes municipales, Tránsito Municipal, Protección Civil, Servicios Públicos, y el SCAPSZ.

Ese mismo día por la tarde se llevó a cabo la reunión con personal directivo y administrativo del Ingenio Emiliano Zapata para tratar la problemática ambiental derivada de la operación del propio Ingenio estando presente la Dirección de Protección Civil, del SCAPZ, PTAR ZACATEPEC, Tránsito Municipal, Servicios Públicos Municipales, autoridades de la CONAGUA, CEA, SECTOR SALUD, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Pro-ambiente Zacatepec.

Julio 6.- Falla en el transformador del re-bombeo de la Colonia Emiliano Zapata (Loma de la Muerte).

Julio 9.- Videograbación al interior del Pozo Vicente Guerrero para hacer un diagnóstico, ya que mientras se distribuía el agua en la tubería los días previos a la descompostura de la bomba, ésta arrojó tierra a la línea principal de distribución y algunas tomas presentaron tierra en sus depósitos. El video muestra algunas raíces penetrando el pozo a los 10 m de profundidad así como un tubo desarenador al fondo del pozo (70 m). El ademe está limpio mostrando falta de grava en algunos tramos. El brocal carece de tubos engravadores.

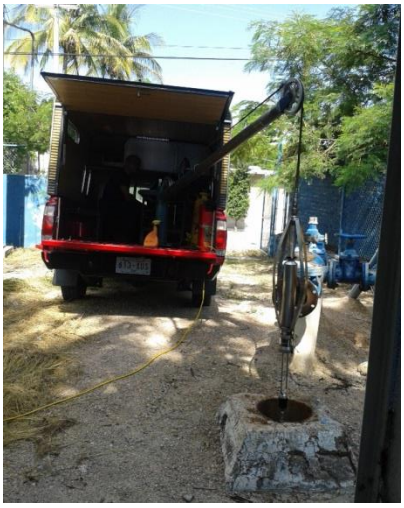

EQUIPO DE VIDEOGRABACIÓN

INSTALACIÓN TRANSFORMADOR COL. EMILIANO ZPATA (LOMA DE LA MUERTE)

El 15 de julio se desmontó la bomba del pozo Chiverías para la reparación de fuga en la columna de la bomba a la altura de la conexión bomba/columna. Se procedió al cambio del niple de descarga volviéndose a instalar de inmediato.

24 de julio.- Inicia el levantamiento del padrón de tomas y red hidráulica de la Col. San Antonio Chiverías con miras a elaborar proyecto de eficientización del sistema mediante control de flujo por válvulas controladoras de flujo.

ADMINISTRATIVO

JUNTAS DE GOBIERNO:

1ª. Ordinaria 27 de febrero 10:00 Hs.

1. Propuesta y Aprobación del Nombramiento del Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor.

2ª. Ordinaria 30 de abril 10:00 Hs.

1. Propuesta y aprobación del Comisario.
2. Propuesta y Aprobación del POA.
3. Propuesta y Aprobación del Manual de Organización y Manual de Procedimientos.
4. Propuesta y Aprobación del Organigrama.
5. Propuesta y Aprobación de la Plantilla de Personal.
6. Propuesta y Aprobación del Tabulador de Sueldos.
7. Propuesta y Aprobación del Fondo Revolvente.
8. Propuesta y Aprobación de los Lineamientos de Comprobación y Justificación del Gasto.
9. Propuesta y Aprobación de Combustible y Vehículos de Apoyo.
10. Propuesta y Aprobación del Presupuesto de Ingresos.
11. Propuesta y Aprobación del Presupuesto de Egresos.
12. Presentación y Aprobación del Corte del Primer Trimestre del Ejercicio 2013.

1ª. Extraordinaria 28 de mayo 10:00 Hs.

1. Revisión y Aprobación de los Lineamientos de Comprobación y Justificación del Gasto.
2. Revisión del Corte del Primer Trimestre del Ejercicio 2013.

3ª. Ordinaria 19 de junio 11:00 Hs.

1. Análisis y aprobación del ajuste a las tarifas por servicio de agua potable.
2. Análisis y aprobación para ratificar el nombre del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Mor.
3. Análisis y aprobación del pago de aguinaldo 2012 a los trabajadores del SCAPSZ.

4ª. Ordinaria 31 de julio 8:30 Hs.

1. Presentación y aprobación del segundo corte trimestral del ejercicio 2013.
2. Asuntos generales.

Se presentó la cuenta pública de los primeros dos trimestres de 2013 al Congreso del Estado en tiempo y forma.

A partir del mes de julio se ha fortalecido la medida de recuperación del rezago mediante el corte del servicio a los usuarios con más de tres meses de rezago. El resultado ha sido satisfactorio.

El 31 de julio se publica en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con numero de ejemplar **5108**, el acta de la 3ª. Junta de Gobierno en que se ratifica el nombre del SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR, siendo éste el nombre oficial reconocido por la SHCP desde 1995, no así el de ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en el año 2006.

ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL 2° TRIMESTRE

ACTIVIDAD	NUM. DE ACCIONES	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
Servicios de reparación de fugas en la calle	157	La mayor parte del municipio.	Se sigue combatiendo el rezago reparándolas fugas conforme se van presentando.
Desazolve de drenajes (menores)	54	La mayor parte del municipio.	Seguimos combatiendo el rezago desazolvando los drenajes conforme se van presentando
Instalación de tomas nuevas	26	La mayor parte del municipio.	
Reconexiones de servicio	32	La mayor parte del municipio.	
Reparación de fugas mayores en línea de conducción de agua potable (tuberías de 8", 12" y 14")	11	Cabecera Municipal y Galeana Centro	
Cambio de válvulas de control defectuosas de 2", 2.5" y 3"	4	Cabecera Municipal, Galeana Centro y Chiverías	
Instalación de válvulas de control para mejorar la eficiencia del tandeo	3	Galeana Centro, Emiliano Zapata	
